


大山口小学校の校庭

位置図

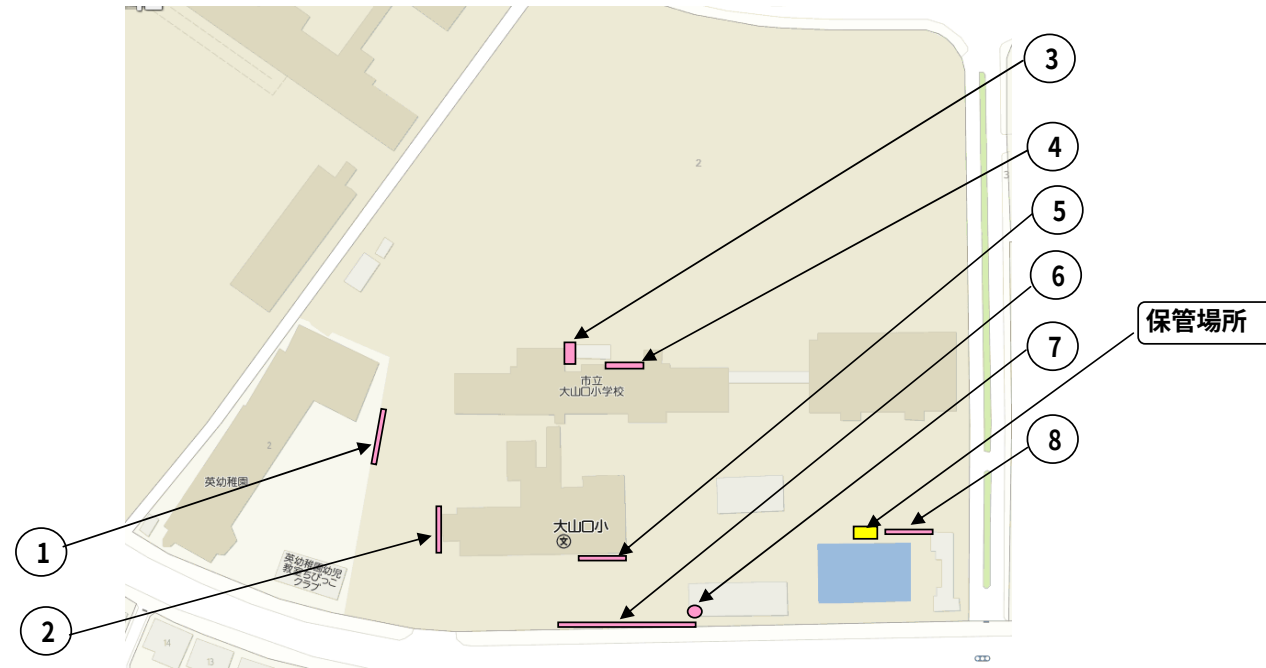

実施日:平成23年12月1日(木)～21日(水)

単位:マイクロシーベルト/時

場所		除染前		除染後		除染方法
		5cm	50cm	5cm	50cm	
大山口小学校	① 英幼稚園沿いフェンス際	—	0.330	—	0.137	土砂の撤去 (土のうに詰め、プール脇に一時保管)
	② A棟非常階段下	—	0.435	—	0.165	地面の土を10cm程度除去 (土のうに詰め、プール脇に一時保管)
	③ A棟裏更衣室脇の雨とい下コンクリート部	—	0.201	—	0.189	土の除去及び、コンクリート部を水で洗浄 (土のうに詰め、プール脇に一時保管)
	④ A棟と更衣室の間	—	0.351	—	0.147	地面の土を2～3cm程度除去 (土のうに詰め、プール脇に一時保管)
	⑤ B棟わかば学級前側溝	—	0.373	—	0.197	土・落ち葉の除去 (土のうに詰め、プール脇に一時保管)
	⑥ 学年園後ろフェンス沿い	—	0.312	—	0.179	土・落ち葉の除去 (土のうに詰め、プール脇に一時保管)
	⑦ C棟裏雨とい下	—	0.638	—	0.190	地面の土を20cm程度除去 (土のうに詰め、プール脇に一時保管)
	⑧ プール入り口横	—	0.473	—	0.238	土・落ち葉の除去 (土のうに詰め、プール脇に一時保管)
